


**REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES ETAPES DE  
REALISATION DE LA BÂCHE DE POMPAGE PAR HAVAGE**

Crédits photos : CLASSE Environnement & BRGM/DPSM/UTAM Nord

**1<sup>ère</sup> étape** : Réalisation d'une bêche sécante directement au niveau du TN.

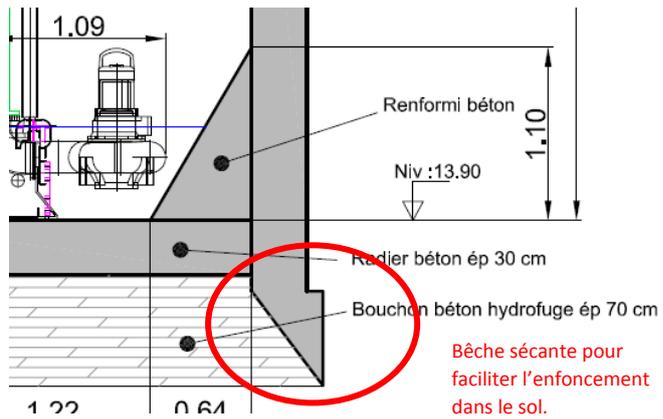

**2<sup>ème</sup> étape** : Ferrailage et coulage du béton des parois du poste (partie inférieure)



**3<sup>ème</sup> étape** : Retrait des banches avec ferrailage en attente pour liaisonner la partie inférieure du poste (visible sur les photos) avec la partie supérieure (à créer).



**4<sup>ème</sup> étape** : Opération d'excavation des terres intérieures et descente progressive du poste.  
(pompage des arrivées d'eau exclusivement en fond d'ouvrage)



**5<sup>ème</sup> étape** : Opération de descente de la seconde et dernière partie du poste



**6<sup>ème</sup> étape** : Réalisation du radier et de la dalle de couverture, pose des équipements et des aménagements extérieurs

